

	SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO UPS BACK UP EMERSON – LIEBERT DE 20KVA – 18KW EMPRESA: RANSA COMERCIAL S.A. ÁREA: ALMACENES INDIA (DOLLAR CITY) CUARTO DE DATA PISO #2		
Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	03 DE FEBRERO DE 2026	INFORME #197	OT# 8119

SERVICIO DE INSTALACION DEL EQUIPO UPS BACK UP EMERSON – LIEBERT DE 20KVA/18KW

EMPRESA: RANSA COMERCIAL S.A.

**ÁREA: ALMACENES INDIA (DOLLAR CITY)
CUARTO DE DATA PISO #2**



DIRECCIÓN : A.V. NESTOR GAMBETA N#3235-CALLAO

CONTACTO : GISELLA SALAZAR LOPEZ

CARGO : SUPERVISOR

MÓVIL : 941697561

EMAIL : gsalazarl@ransa.net

	SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO UPS BACK UP EMERSON – LIEBERT DE 20KVA – 18KW EMPRESA: RANSA COMERCIAL S.A. ÁREA: ALMACENES INDIA (DOLLAR CITY) CUARTO DE DATA PISO #2		
Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	03 DE FEBRERO DE 2026	INFORME #197	OT# 8119

INFORME TÉCNICO

EMPRESA : RANSA COMERCIAL S.A.
LOCAL : AV. NÉSTOR GAMBETA #3235
ENCARGADO : BRAYAN VILLA
ASUNTO : INSTALACION UPS BACKUP EMERSON LIEBERT ITA 20KVA
FECHA DEL SERVICIO : 03-02-2026
TECNICO RESPONSABLE : EDWIN ESPINO – ERNESTO ESPICHAN
N° HOJA DE SERVICIO : **003269**

1. ANTECEDENTES:

El siguiente informe Técnico se presenta a solicitud de la empresa: **RANSA COMERCIAL S.A.** De acuerdo con la programación y coordinación con el responsable por parte del Cliente a cargo: **Danny Garrido**. El servicio se efectuó el día: **03/02/2026**. El equipo UPS cuenta con tablero de maniobra a Bypass externo sin corte de alimentación automático. El equipo intervenido es el identificado como el **UPS** de potencia: **20KVA**, marca: **EMERSON - LIEBERT**, modelo: **UHA3R-0200L**, y con número serie: **2101200782217B070013**. Este equipo UPS se encuentra ubicado en el Área de Cuarto de Data, 2do Nivel, Almacenes India (Dollar City).

2. ACCIONES REALIZADAS:

Revisión general del equipo	X	Elementos de medición	
Limpieza general del equipo		Transformador	X
Ajuste mecánico del equipo	X	Relés	
Ajuste de bornes de conexión	X	Filtros	
Revisión del sistema de control	X	Tablero de Bypass	X
Baterías	X	Condensadores	
Tarjeta de fuentes de alimentación		Accesorios	
Tarjeta de protección		Arranque del equipo	X
Tarjeta de control		Prueba en vacío	X
Tarjeta de medición y señalización		Pruebas con carga	X
Panel remoto		Instalación del equipo	X
Indicadores luminosos		Instalación eléctrica	
Sensores		Instalación de tarjeta de red	

- **PASO N°1:** Se procedió a visualizar el estado del equipo UPS actual instalado, el cual se encontró encendido en modo bypass y con sus 02 bancos externos desconectados.
- **PASO N°2:** Sus cargas se encontraron alimentadas directamente por energía comercial proveniente del transformador de aislamiento, mediante el bypass electrónico del UPS.
- **PASO N°3:** Se procede a realizar el apagado de cargas eléctricas por parte del personal de TI, posterior a ellos se procede a realizar la desconexión y el retiro del equipo a reemplazar.
- **PASO N°4:** Se realiza la instalación del equipo UPS en calidad de backup y bancos de baterías externos en el mismo lugar donde se encontró instalado el equipo en su estructura metálica.
- **PASO N°5:** El UPS queda en modo línea, operativo protegiendo cargas eléctricas y sin alarmas presentes.

	SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO UPS BACK UP EMERSON – LIEBERT DE 20KVA – 18KW EMPRESA: RANSA COMERCIAL S.A. ÁREA: ALMACENES INDIA (DOLLAR CITY) CUARTO DE DATA PISO #2		
Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	03 DE FEBRERO DE 2026	INFORME #197	OT# 8119

3. CARACTERISTICAS DEL UPS:

• UBICACION:	Cuarto Data Piso #2
• Equipo:	UPS
• Potencia:	20KVA
• Marca:	Emerson - Liebert
• Serie:	2101200782217B070013
• Modelo:	UHA3R-0200L
• Tensión Entrada:	380 VAC 3PH + N + G
• Tensión Salida:	380 VAC 3PH + N + G
• Fases:	TRIFASICO
• Nivel de Carga:	7.4%
• Año de Fabricación:	2017
• Estado	OPERATIVO
• Potencia y Serie de Modulo Potencia #1:	NO
• Potencia y Serie de Modulo Potencia #2:	NO
• Potencia y Serie de Modulo Potencia #3:	NO
• Banco Interno:	SI
• # Baterías Banco Interno:	-
• Amperaje de Baterías:	-
• Año de Fabricación:	-
• Banco Externo:	SI
• # Baterías Banco Externo:	128 UNID.
• Amperaje de Baterías:	12Vdc – 9.0Ah
• Año de Fabricación:	2023 - 2024
• Tarjeta SNMP:	NO
• Punto Red:	NO
• Bypass Interno:	SI
• Tablero Bypass Externo:	SI / Sin corte Automático
• TVSS:	SI
• Aire Acondicionado:	Si – Ducto
• Equipo de Entrada:	SI
• Equipo:	TRANSF. AISLAMIENTO
• Potencia:	12KVA
• Marca:	CENTRALION
• Serie:	20220803000824
• Modelo:	TA12KDY
• Tensión de Entrada:	220 VAC
• Tensión de Salida:	380 VAC
• Fases:	3PH
• Estado:	OPERATIVO
• Año:	2022
• Corriente:	-
• Conexión:	Dyn5
• Peso:	-
• Frecuencia:	60
• Altitud:	1000MSNM
• Factor:	K-1
• Clase:	F

VISTA PANORAMICA





**SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO UPS
BACK UP EMERSON – LIEBERT DE 20KVA – 18KW
EMPRESA: RANSA COMERCIAL S.A.
ÁREA: ALMACENES INDIA (DOLLAR CITY)
CUARTO DE DATA PISO #2**




Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	03 DE FEBRERO DE 2026	INFORME #197	OT# 8119

FOTOGRAFIAS DEL SERVICIO INSTALACION DEL UPS

ESTADO DEL UPS A REEMPLAZAR



TABLERO BYPASS AUTOMATICO

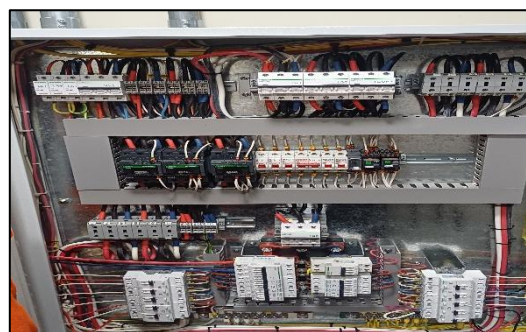

DESCONEXION UPS AVERIADO




CARACTERISTICAS DEL TX




CARACTERISTICAS DEL UPS




TENSION DE ENTRADA

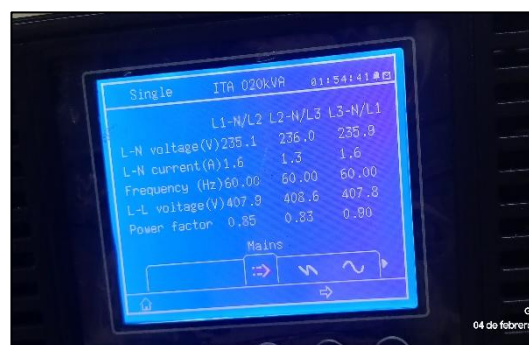

TENSION DE BYPASS

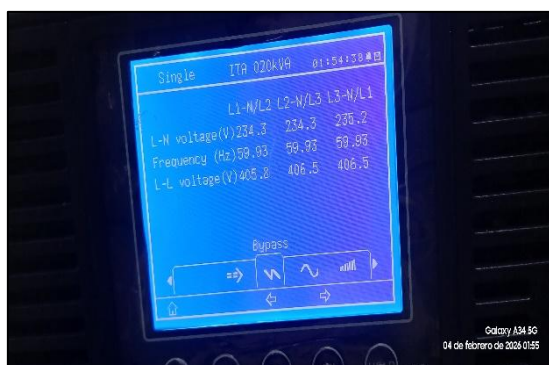

TENSION DE SALIDA

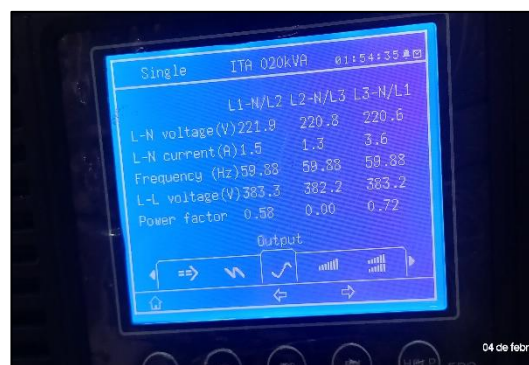



**SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO UPS
BACK UP EMERSON – LIEBERT DE 20KVA – 18KW
EMPRESA: RANSA COMERCIAL S.A.
ÁREA: ALMACENES INDIA (DOLLAR CITY)
CUARTO DE DATA PISO #2**



Elaborado por:

MAFORT SERVICE S.A.C

Date

03 DE FEBRERO DE 2026


Referente

INFORME #197


Orden de Trabajo

OT# 8119


REGISTRO DE CARGA POR FASE

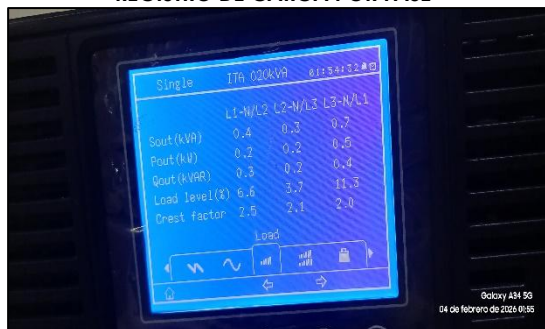

TENSION DE BATERIAS

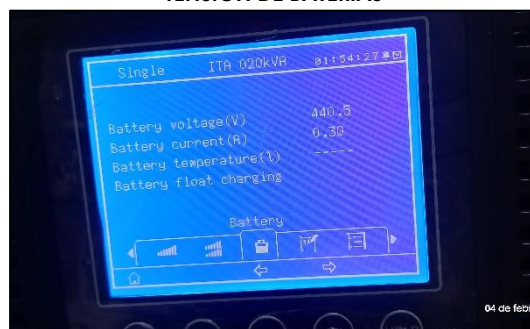

PORCENTAJE DE CARGA TOTAL

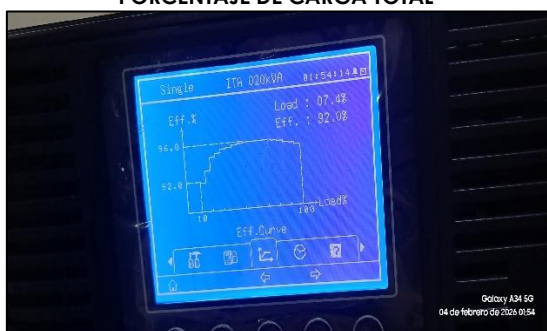

DUCTO DE A/A



FALTA DE HERMETIZACION EN LA SALA



CONEXIONADO FINAL DEL EQUIPO



MEDICIONES EN LA RED ELÉCTRICA

PARAMETROS	R (RS)	S(ST)	T(TR)
L – N Voltaje (V)	235.1 VAC	236.0 VAC	235.9 VAC
L – N Intensidad (A)	1.6 AMP	1.3 AMP	1.6 AMP
Frecuencia (Hz)	60.00 HZ	60.00 HZ	60.00 HZ
L – L Voltaje (V)	407.9 VAC	408.6 VAC	407.8 VAC
Factor De Potencia	0.85	0.83	0.90

MEDICIONES EN EL BYPASS DEL UPS

PARAMETROS	R (RS)	S(ST)	T(TR)
L – N Voltaje (V)	234.3 VAC	234.3 VAC	235.2 VAC
Frecuencia (Hz)	59.93 HZ	59.93 HZ	59.93 HZ
L – L Voltaje (V)	405.8 VAC	406.5 VAC	406.5 VAC

MEDICIONES EN LA SALIDA DEL UPS

PARAMETROS	R (RS)	S(ST)	T(TR)
L – N Voltaje (V)	221.9 VAC	220.8 VAC	220.6 VAC
L – N Intensidad (A)	1.5 AMP	1.3 AMP	3.6 AMP
Frecuencia (Hz)	59.88 HZ	59.88 HZ	59.88 HZ
L – L Voltaje (V)	383.3 VAC	382.2 VAC	383.2 VAC
Factor De Potencia	0.58	0.00	0.72

	SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO UPS BACK UP EMERSON – LIEBERT DE 20KVA – 18KW EMPRESA: RANSA COMERCIAL S.A. ÁREA: ALMACENES INDIA (DOLLAR CITY) CUARTO DE DATA PISO #2		
Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	03 DE FEBRERO DE 2026	INFORME #197	OT# 8119

REGISTRO DE CARGA POR FASE

PARAMETROS	R (RS)	S(ST)	T(TR)
KVA	0.4	0..3	0.7
KW	0.2	0.2	0.5
KVAR	0.3	0.2	0.4
Nivel De Carga	6.6	3.7	11.2
Factor de Cresta	2.5	2.1	2.0

4. DIAGNOSTICO DEL UPS:

- ✓ El equipamiento cuenta con un Tablero Bypass automático, en caso de mantenimiento o falla del equipo, Trasladando a modo red comercial sin afectar su carga conectada.
- ✓ El UPS cuenta con un Transformador de Aislamiento 12KVA, con entrada 220 /380 VCA + N.
- ✓ El área donde se encuentra instalado el equipamiento no se encuentra hermetizado debidamente y cuenta con aire acondicionado tipo ducto, temperatura ambiente es de 21°C aproximadamente.
- ✓ El equipo UPS después de las pruebas de funcionamiento a las que fue sometido, queda protegiendo cargas eléctricas y operando a un 7.4% de su capacidad total.
- ✓ Se realizaron pruebas de funcionamiento comprobando la correcta operación del equipo, así como la protección a la carga.
- ✓ El UPS cuenta con 04 bancos externos de 32 unidades cada uno, lo que sumaría un Total de 128 unidades de 12VDC- 9.0Ah, Año Fabricación 2023 y 2024, las cuales se encuentran operativas.
- ✓ El equipo UPS actualmente no cuenta con Tarjeta SNMP para el monitoreo remoto del equipo.
- ✓ Se realizaron pruebas de funcionamiento en vacío con carga y simulando corte de energía eléctrica el cual el UPS responde de manera óptima.
- ✓ UPS queda operativo, sin alarmas y protegiendo cargas eléctricas.

5. RECOMENDACIONES:

- ✓ **Se recomienda realizar la hermetizacion de la sala donde se encuentra instalado el equipamiento de esta manera se mantendrá una temperatura constante y sin perdida de enfriamiento.**
- ✓ Se recomienda realizar mantenimientos periódicos al equipamiento cada 06 meses para evitar que el polvo se acumule en el UPS.
- ✓ El UPS debe operar en un ambiente libre de polución, humedad y en un área climatizada teniendo una temperatura de 21°C, una temperatura mayor a la descrita disminuye y acorta el tiempo de vida útil de las baterías.
- ✓ Se recomienda que las maniobras de Bypass en el UPS o tablero eléctrico sean realizadas por personal técnico calificado y con experiencia en este tipo de equipos para evitar un mal funcionamiento del equipo UPS y dejar sin protección las cargas del sistema.

	SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO UPS BACK UP EMERSON – LIEBERT DE 20KVA – 18KW EMPRESA: RANSA COMERCIAL S.A. ÁREA: ALMACENES INDIA (DOLLAR CITY) CUARTO DE DATA PISO #2		
Elaborado por: MAFORT SERVICE S.A.C	Date 03 DE FEBRERO DE 2026	Referente INFORME #197	Orden de Trabajo OT# 8119

- ✓ Se recomienda realizar limpiezas periódicas al lugar donde se encuentra instalado el equipo UPS y Transformador de aislamiento para evitar la acumulación y recirculación del polvo.
- ✓ El equipo está diseñado para trabajar con una tensión alterna de 380Vac+ N, debidamente conectado al sistema tierra y con su respectivo Transformador de Aislamiento.
- ✓ No conectar cargas indebidas como: cargadores de celular, impresoras, taladros, o cualquier equipo que contenga motor de trabajo.

Sin otro particular.

Atentamente,

MAFORT SERVICE S.A.C
SOPORTE TÉCNICO
