

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS VERTIV UPS DE 6KVA EMPRESA: ACURIO/TANTA – EL POLO		
Elaborado por: MAFORT SERVICE S.A.C	Date 18 DE FEBRERO DE 2026	Referente INFORME#0235	Orden de Trabajo OT# 8141-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS VERTIV UPS DE 6KVA EMPRESA: ACURIO/TANTA – EL POLO



DIRECCIÓN: AV. VASCO NUÑEZ DE BALBOA #260-MIRAFLORES.

CONTACTO: SR. MARTÍN MESIAS.

MÓVIL: 984 838 021

EMAIL: mmesias@acuriorestaurantes.com

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS VERTIV UPS DE 6KVA EMPRESA: ACURIO/TANTA – EL POLO		
Elaborado por: MAFORT SERVICE S.A.C	Date 18 DE FEBRERO DE 2026	Referente INFORME#0235	Orden de Trabajo OT# 8141-1

INFORME TÉCNICO#

EMPRESA : **ACURIO RESTAURANTE – TANTA EL POLO.**
LOCAL : **AV. EL POLO 695 - SURCO.**
ENCARGADO : **MARTIN MESIAS.**
ASUNTO : **MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS DE 6KVA VERTIV.**
FECHA DEL SERVICIO : **18-02-2026**
TENICO RESPONSABLE : **JOSE TEODORO / ERNESTO ESPICHAN.**

ANTECEDENTES:

El siguiente informe técnico se presenta a solicitud de la empresa: **ACURIO-TANTA**. De acuerdo a la programación y coordinación con el responsable por parte del cliente, **MARTÍN MESÍAS**. El servicio se efectuó el día: **18/02/2026**. El sistema UPS cuenta con módulo de bypass interno sin corte de alimentación. No se deberá provocar a la carga crítica ningún corte de energía intempestivo. El equipo intervenido es el identificado como el **UPS** de potencia: **6KVA**, marca: **VERTIV**, modelo: **GXT5-6000IRT5UXLN** y con número serie: **2131301273BWGB3**. Este equipo UPS se encuentra ubicado en el **Piso #2**.

ACCIONES REALIZADAS:

Revisión general del equipo	X	Elementos de medición	X
Limpieza general del equipo	X	Transformador	X
Ajuste mecánico del equipo	X	Relés	X
Ajuste de bornes de conexión	X	Filtros	X
Revisión del sistema de control	X	Tablero de Bypass	X
Instalación de Baterías Nuevas	X	Condensadores	X
Tarjeta de fuentes de alimentación	X	Accesorios	
Tarjeta de protección	X	Arranque del equipo	X
Tarjeta de control	X	Prueba en vacío	X
Tarjeta de medición y señalización	X	Pruebas con carga	X
Panel remoto		Instalación del equipo	
Indicadores luminosos	X	Instalación eléctrica	
Sensores	X	Instalación de tarjeta de red	

- PASO N°1:** Se procedió a visualizar el estado actual del equipo UPS, el cual se encontró encendido, en modo Inversor y brindando energía eléctrica estabilizada hacia las cargas dependientes del UPS. Pero mostrando alerta por fallo de baterías.
- PASO N°2:** Se realiza la transferencia de carga a red comercial, mediante el display del equipo en el tablero de transferencia, sin afectar el servicio.
- PASO N°3:** Se procede a destapar el equipo UPS, limpiando la tarjeta de control, coolers, etapa de filtros (condensadores), panel de control, rejillas y tapas metálicas. Al término de la limpieza se procede al ensamblado del mismo.
- PASO N°4:** Se realiza medición de voltajes y resistencia interna de cada una de las baterías que conforman el banco interno.
- PASO N°5:** El UPS queda en modo línea, sin alarma presente y operativo.

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS VERTIV UPS DE 6KVA EMPRESA: ACURIO/TANTA – EL POLO		
Elaborado por: MAFORT SERVICE S.A.C	Date 18 DE FEBRERO DE 2026	Referente INFORME#0235	Orden de Trabajo OT# 8141-1

CARACTERÍSTICA DE LOS EQUIPOS:

• Ubicación:	PISO #2	VISTA PANORÁMICA
• Equipo:	UPS	UPS 
• Potencia:	6KVA	
• Marca:	VERTIV	
• Serie:	2131301273BWGB3	
• Modelo:	GXT5-6000IRT5UXLN	
• Tensión Entrada:	220VAC	
• Tensión Salida:	220VAC	
• Corriente Entrada:	1.5 A	
• Corriente Salida:	1.0 A	
• Fases:	1PH	
• Nivel de Carga:	3.7%	
• Año de Fabricación:	2021	
• Estado:	OPERATIVO	
• Bco. Batería Interno:	SI	
• # Baterías Bco. Interno:	16Und	
• Voltaje/Amperaje Bat.:	12VDC/ 9Ah	
• Año de Fabricación:	2022	
• Bco. Batería Externo:	NO	
• # Baterías Bco. Externo:	NO	
• Voltaje/Amperaje Bat.:	NO	
• Año de Fabricación:	NO	
• Tarjeta SNMP:	SI	
• Punto de Red:	NO	
• Dirección IP:	NO	
• Bypass Interno:	SI	
• Tablero De Bypass:	NO	
• TVSS:	NO	
• A/A:	-	
• Equipo de Entrada:	SI	
• Equipo:	TRAFO DE AISLAMIENTO	
• Potencia:	-	
• Marca:	-	
• Serie:	-	
• Modelo:	-	
• Tensión de Entrada:	220VAC	
• Tensión Salida:	220VAC	
• Fases:	1F	
• Estado:	OPERATIVO	
• Año de Fabricación:	-	
• Corriente:	NO	
• Conexión:	NO	
• Peso:	NO	
• Frecuencia:	60HZ	
• Altitud:	NO	
• Factor:	NO	
• Clase:	NO	

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS VERTIV UPS DE 6KVA EMPRESA: ACURIO/TANTA – EL POLO		
Elaborado por: MAFORT SERVICE S.A.C	Date 18 DE FEBRERO DE 2026	Referente INFORME#0235	Orden de Trabajo OT# 8141-1

FOTOS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPS 6KVA


CARACTERÍSTICAS DE UPS




ESTADO INICIAL DEL EQUIPO UPS



RETIRO DE CUBIERTAS

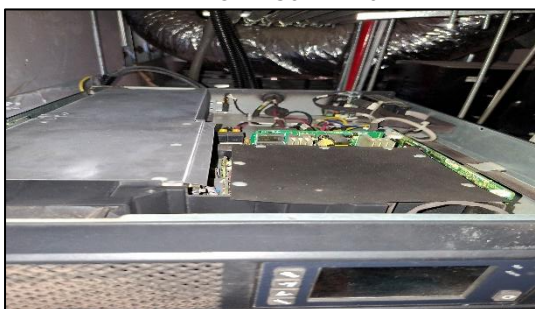

LIMPIEZA CON BROCHA

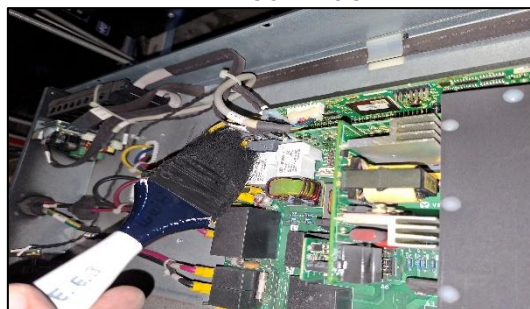

LIMPIEZA CON SOPLADORA



LIMPIEZA VENTILAD



ESTADO FINAL DEL VENTILADOR



CARACTERÍSTICAS DE LAS BATERIAS



AÑO DE FABRICACION: 2022



VOLTAJE EN FLOTACION




	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS VERTIV UPS DE 6KVA EMPRESA: ACURIO/TANTA – EL POLO		
Elaborado por: MAFORT SERVICE S.A.C	Date 18 DE FEBRERO DE 2026	Referente INFORME#0235	Orden de Trabajo OT# 8141-1

MEDICION RESISTENCIA INTERNA



CARGA DEL UPS

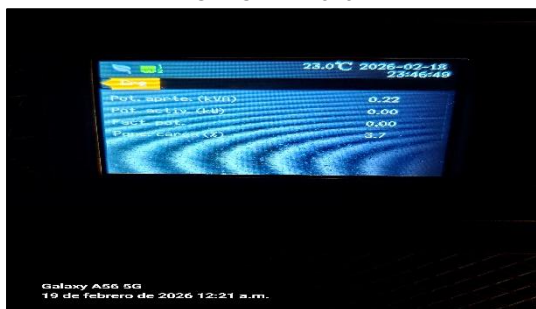

VOLTAJE DE ENTRADA



VOLTAJE DE SALIDA



MEDICIÓN BANCO DE BATERÍAS DE 12VDC – 9.0Ah / año: 2022

P1	Voltaje en Flotación (VDC)	P1	Resistencia Interna (mΩ)
1	13.3	1	34.2
2	13.5	2	45.4
3	13.3	3	33.6
4	13.4	4	38.0
5	13.5	5	53.3
6	13.3	6	1.48
7	13.5	7	45.6
8	13.4	8	41.8
9	13.3	9	39.6
10	13.3	10	41.9
11	13.4	11	39.1
12	13.4	12	35.5
13	13.3	13	45.2
14	13.3	14	44.9
15	13.3	15	37.4
16	13.2	16	49.6

MEDICIONES EN LA RED ELÉCTRICA

PARÁMETROS	L1-N/L2
L – N Voltaje (V)	221.0
L – G Voltaje (V)	221.0
N – G Voltaje (V)	0
Frecuencia (Hz)	60
Corriente Trabajo (A)	1.5

MEDICIONES EN LA SALIDA DEL UPS

PARÁMETROS	L1-N/L2
L – N Voltaje (V)	219.1
L – G Voltaje (V)	219.1
N – G Voltaje (V)	0
Frecuencia (Hz)	60
Corriente Trabajo (A)	1.0

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS VERTIV UPS DE 6KVA EMPRESA: ACURIO/TANTA – EL POLO		
Elaborado por: MAFORT SERVICE S.A.C	Date 18 DE FEBRERO DE 2026	Referente INFORME#0235	Orden de Trabajo OT# 8141-1

DIAGNÓSTICO DEL EQUIPO UPS:

- El equipo UPS se encontró encendido en modo inversor, protegiendo cargas eléctricas de TI.
- Este equipo cuenta con tablero eléctrico de Bypass sin corte de energía.
- Se efectuó el mantenimiento del UPS, limpieza y lubricación de los ventiladores frontales, la limpieza externa del UPS, comprobación de las funciones del UPS (pruebas de operatividad).
- Se realizó la medición de resistencia interna de cada una de las baterías las cuales se encuentran fuera de sus rangos normales.
- El equipo UPS después de las pruebas de funcionamiento a las que fue sometido, queda operativo sin alarmas y protegiendo cargas eléctricas.
- UPS queda encendido en modo inversor, protegiendo cargas eléctricas y operando a un 3.7% de su capacidad total.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda que las maniobras de Bypass en el UPS sean realizadas por personal técnico calificado y con experiencia en este tipo de equipos para evitar un mal funcionamiento del equipo UPS y dejar sin protección las cargas del sistema.
- **SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO TOTAL DE SUS BATERIAS INTERNAS POR TENER CICLO DE VIDA UTIL CUMPLIDO.**
- El equipo está diseñado para trabajar con una tensión alterna de 220 VAC+ N debidamente conectado al sistema de puesta a tierra y con su respectivo transformador de aislamiento.
- Se recomienda realizar limpiezas periódicas al ambiente donde se encuentra instalado el UPS de esta manera se puede controlar la acumulación y recirculación del polvo en el UPS.
- El UPS debe operar en un ambiente libre de polución, humedad y en un área climatizada teniendo una temperatura de 18°C a 21°C, una temperatura mayor a la descrita disminuye y acorta el tiempo de vida útil de las baterías.
- Realizar el mantenimiento preventivo anual al sistema de puesta a tierra del sistema estabilizador UPS, para asegurar la protección personal, de equipos y procesos del cliente; como también para asegurar la referencia equipotencial entre sistemas.
- No conectar cargas indebidas, como son impresoras láser de mediana y gran capacidad, cafeteras, cargadores de baterías de celulares, taladros, motores universales, moto bomba, etc. Sin antes haber evaluado la sumatoria de todas sus corrientes de arranque y haber dimensionado debidamente la capacidad del Equipo.

Sin otro particular.
Atentamente,

MAFORT SERVICE S.A.C
SOPORTE TÉCNICO
