



**SERVICIO DE VISITA TECNICA INSTALACION
ESTABILIZADORES
AREA: BOTICA INKAFARMA
EMPRESA: FARMACIAS PERUANAS**



Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	04 DE MARZO DE 2026	INFORME 244	OT:

**SERVICIO DE VISITA TECNICA INSTALACION
ESTABILIZADORES
AREA: BOTICA INKAFARMA
EMPRESA: FARMACIAS PERUANAS**



Dirección: Jr. Víctor Alzamora 147, La Victoria 15034
Contacto: Ana Aliaga Diaz
Cargo: Analista de Adquisiciones
Email: Ana.Aliaga@farmaciasperuanas.pe

	SERVICIO DE VISITA TECNICA INSTALACION ESTABILIZADORES AREA: BOTICA INKAFARMA EMPRESA: FARMACIAS PERUANAS		
Elaborado por: MAFORT SERVICE S.A.C	Date 04 DE MARZO DE 2026	Referente INFORME 244	Orden de Trabajo OT:

INFORME TECNICO

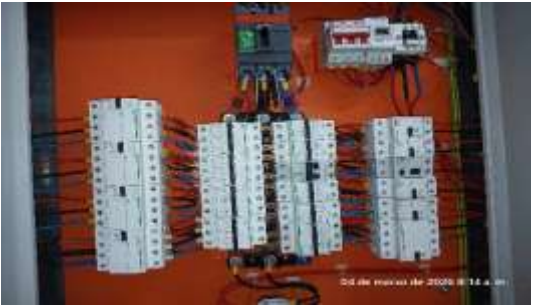
EMPRESA : FARMACIAS PERUANAS
LOCAL : Botica Inkafarma Av. San Luis 1629 San Borja
ENCARGADO : Ana Aliaga D.
ASUNTO : Vista técnica a Botica
FECHA DEL SERVICIO : 04.03.26
TECNICO RESPONSABLE : Raul Rojas Mattos
Nº HOJA DE SERVICIO :

ANTECEDENTES:

El siguiente informe Técnico se presenta a solicitud de la empresa: Farmacias Peruanas de acuerdo a la programación y coordinación con el responsable por parte del Cliente; **Ana Aliaga** se efectuó el día **04.03.26**, realizándose una visita técnica para evaluación de Instalación de Equipos Estabilizadores y correctivos de tomacorrientes estabilizados

- **PASO N°1:** Se procedió con la verificación del área donde se encuentra ubicado los Tableros Eléctricos para futuras instalaciones de equipos estabilizadores de 5 Kva monofásicos.
- **PASO N°2:** Se procede a escuchar la charla del Ing. encargado detallando la instalación y ubicación de los equipos a instalar.
- **PASO N°3:** Indicación como se debe quedar los tomacorrientes Estabilizados (correctivos)

FOTOGRAFIAS DEL SERVICIO

TABLERO ELECTRICO	TABLERO ELECTRICO
	
POSIBLE UBICACIÓN DE LOS ESTABILIZADORES	SISTEMA ELECTRICO ESTABILIZADORES
	
ITM,s ENTRADA/ SALIDA ESTABILIZADORES	CONMUTADOR 1-0-2 PARA LA CARGA



**SERVICIO DE VISITA TECNICA INSTALACION
ESTABILIZADORES**
AREA: BOTICA INKAFARMA
EMPRESA: FARMACIAS PERUANAS



Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	04 DE MARZO DE 2026	INFORME 244	OT:



ITM,s PARA LA CARGA



ITM,s ESTABILIZADOS CON MANDIL



DIAGRAMA UNIFILAR / DIRECTORIO GENERAL



DIAGRAMA UNIFILAR ESTABILIZADO



TOMACORRIENTES ESTABILIZADOS



TOMACORRIENTES ESTABILIZADOS



RACK DE COMUNICACIONES / UPS



RACK DE COMUNICACIONES / UPS



	SERVICIO DE VISITA TECNICA INSTALACION ESTABILIZADORES AREA: BOTICA INKAFARMA EMPRESA: FARMACIAS PERUANAS			
Elaborado por: MAFORT SERVICE S.A.C	Date 04 DE MARZO DE 2026	Referente INFORME 244	Orden de Trabajo OT:	

GENERALIDADES:

- La visita técnica se realizó en una Botica, que sirve como modelo para la instalación de estabilizadores en los diferentes puntos que se realizaran los servicios.
- Se especificó el modelo de Tablero Eléctrico que servirá para la instalación.
- En el Tablero existe un Sistema eléctrico Estabilizado con sus Interruptores Termomagnéticos de Entrada y Salida para el Estabilizador a instalar.
- Además, existe un Conmutador que servirá como Bypass (Red - 0 – Estabilizador) que alimentará la Carga.
- También está instalado los Interruptores Termomagnéticos con Interruptores Diferenciales para los diferentes circuitos Estabilizados.
- El cliente indico las posibles ubicaciones que estará el equipo, en lo posible lo mas cercano al Tablero, previa coordinación.
- En la instalación se tendrá que instalar tubos Conduit metálicos con revestimiento de PVC ¾" y su respectivo cableado (Entrada/Salida).
- Instalación de los Estabilizadores y el Start-up de los equipos.
- Verificación de la "polaridad" Fase, Neutro, Tierra de los tomacorrientes estabilizados, en los locales se diferencia por su color naranja.
- Anotar y hacer presente cualquier anomalía que se encuentre en la instalación.

Sin otro particular:
Atentamente,

MAFORT SERVICE S.A.C
SOPORTE TÉCNICO
